




Verdal
kommune

Pressekonferanse 10. november 2009

www.verdal.kommune.no

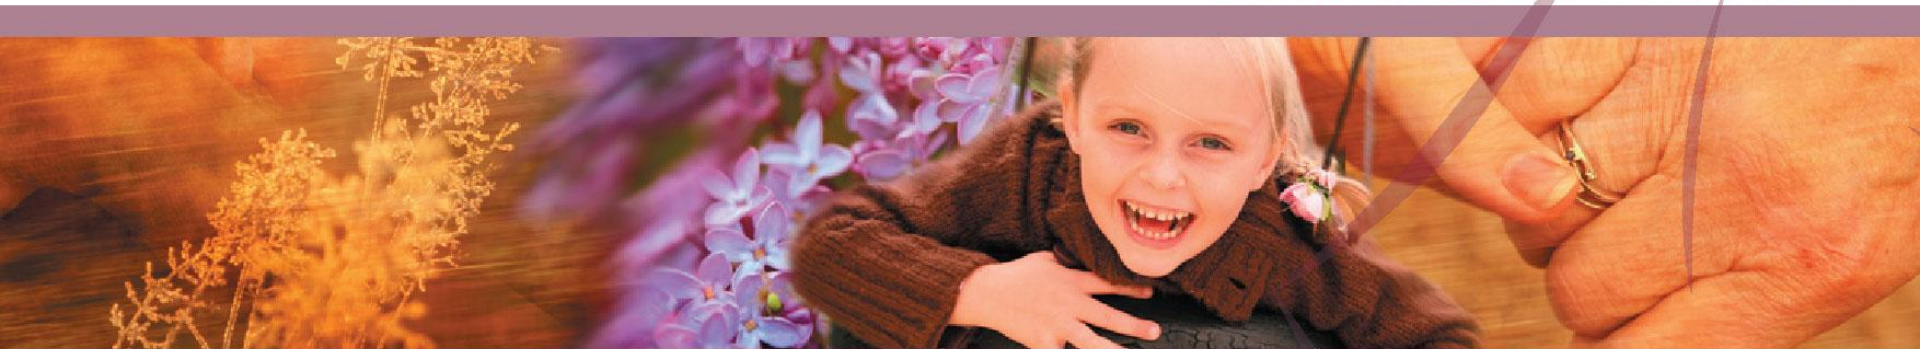

VERDALSØRA BARNESKOLE, VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE, FLERBRUKSHALL OG SVØMMEHALL



Evaluering av tildelingskriterium nr 1 – Gruppens prosjektforslag

30% Firma	Arkitektonisk hovedgrep 30%		Oppfyllelse programkrav 30%		Areal- effektivitet 30%		Generalitet Fleksibilitet 10%		Sum	Sum
	Karakter	Poeng	Karakter	Poeng	Karakter	Poeng	Karakter	Poeng	Poeng	Poeng x 0,3
GRANDE	10	3,0	10	3,0	10	3,0	10	1,0	10	3,00
NCC	7	2,1	4	1,2	9	2,7	5	0,5	6,5	1,95
STJERN	3	0,9	3	0,9	5	1,5	3	0,3	3,6	1,08
HENT	1	0,3	1	0,3	8	2,4	2	0,2	3,2	0,96



Evaluering av tildelingskriterium nr 2 - Pristilbud

Vektes 60%.

1. Økonomisk oppstilling, alle tall eks mva

2.1	NCC	kr 217.356.000,-
2.2	Byggmester Grande	kr 247.916.913,-
2.3	HENT AS	kr 250.000.000,-
2.4	Stjern	kr 273.645.000,-

Gjennomsnittpris kr 247.229.478,-

2. Matrise beregnet ut fra forutsetningene i konkurransegrunnlaget

Vekt – 60%	Karakter	Poeng
NCC	10	6,00
Byggmester Grande	6,93	4,16
HENT	6,72	4,03
Stjern	4,35	2,61

VERDALSØRA BARNESKOLE, VERDALSØRA
 UNGDOMSSKOLE, FLERBRUKSHALL OG SVØMMEHALL



Evaluering av tildelingskriterium nr 3 – Kompetanse nøkkelpersoner

Samlet vurdering teller 10%

	Prosjektleder 30%		Prosjekteringsleder 25%		Arkitekt 30%		Landskapsarkitekt 15%		Sum	Sum
	Karakter	Poeng	Karakter	Poeng	Karakter	Poeng	Kar.	Poeng	Poeng	Poeng x 0,1
GRANDE	10	3,0	10	2,5	10	3,0	8	1,2	9,7	0,97
NCC	7	2,1	8	2,0	5	1,5	8	1,2	6,8	0,68
HENT	8	2,4	9	2,25	1	0,3	6	0,9	5,85	0,59
STJERN	8	2,4	8	2,0	7	2,1	10	1,5	8	0,80

VERDALSØRA BARNESKOLE, VERDALSØRA
UNGDOMSSKOLE, FLERBRUKSHALL OG SVØMMEHALL



Verdal
kommune

Tildelingskriterium	1	2	3	Sum	Rangering
NCC	1,95	6,00	0,68	8,63	1
GRANDE	3,00	4,16	0,97	8,13	2
HENT	0,96	4,03	0,59	5,58	3
STJERN	1,08	2,61	0,80	4,49	4

Vinner av konkurransen er NCC AS



Resultatet av avholdt konkurranse.

- Verdal kommune v/Bedømmelseskomiteen har kåret **NCC AS** til vinner av konkurransen. Det tas forbehold om kommunestyrets behandling og godkjenning.

Budsjett pr. 9. november 2009

1. Tomtetekniske forhold	kr 7.000.000,-
2. Entreprenørkostnad inkl. prosjektering	kr 201.800.000,-
3. Juryering / samspillaktiviteter	kr 700.000,-
4. Samspillrådgiver	kr 900.000,-
5. Byggherreombud	kr 700.000,-
6. Offentlige gebyrer og avgifter	kr 2.000.000,-
7. Kopiering / trykking	kr 200.000,-
8. Fast inventar og løst inventar	kr 15.000.000,-
9. Kunstnerisk utsmykking	kr 1.500.000,-
10. Honorar konkurranse (eks mva!)	kr 2.000.000,-
11. Byggelånsfinansiering (5% p.a.)	kr 9.890.000,-
12. Prisstigning – april 2010 – november 2011 (4% årlig prisstigning)	kr 4.310.000,-
13. Marginer / reserver kr	
13.1 Generell usikkerhet	kr 10.000.000,-
13.2 Avsatt til kvalitetsheving	kr 4.000.000,-
SUM	kr 260.000.000,-
Merverdiavgift	kr 15.000.000,-
BUDSJETT	kr 275.000.000,-



Orientering om prosessen fra og med 27. oktober kl 12.00.

1. Orienteringsmøte kl 13

- Informasjon om den videre prosessen
- Program for Stiklestad, 2. – 4. november
- Erklæring ved mottak av materiell
- Utdeling av materiell

Alt materiell behandles konfidensielt fram til og med 10. november 2009.

2. Bedømmelseskomiteen starter sitt arbeid på Stiklestad Hotell, mandag 2. november kl 10.30.

Planlagt ferdig evaluering 4. november.

Reservedag fredag 6. november.

3. Endelig dokument med innstilling for utsendelse til politisk behandling,

tirsdag 10. november 2009.

Tilbyderne og pressen orienteres tirsdag 10. november 2009.

Orientering om prosessen fra og med 27. oktober kl 12.00, forts

4. Utstilling av prosjektforslagene på rådhuset fra og med onsdag 11. november og fram til 1. desember 2009.
5. Endelig behandling i kommunestyremøte 30. november 2009.
6. Planlagt kontraktsmøte, tirsdag 1. desember 2009 kl 13.00.
7. Orienteringsmøte på Rica Hell, Stjørdal torsdag 3. desember kl 09 – 15.30.
8. Utviklings / samspillfase – fra 4. desember 2009 til 19. mars 2010.
9. Endelig kontrakt – 16. april 2010.
10. Planlagt byggestart – 31. mai 2010.
11. Ferdigstillelse bygg – 30. november 2011.
12. Innflytting desember 2011.
13. Riving av eksisterende bygg utføres i 1. kvartal 2012.
14. Ferdigstillelse utearealer – 1. juli 2012.
